

# **PARMC**

## **PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA**

**Antonella Sangiovanni**

**Maggio 2010**

**Versione 1.0**

## Sommario

PREMESSA.....	3
OBIETTIVI .....	3
DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....	4
IDENTIFICAZIONE DEI COSTI DEI MATERIALI E DELLE RISORSE UMANE.....	7
IDENTIFICAZIONE DEI COSTI NEL TEMPO.....	8




## PREMESSA

Come noto, con il **D.L. 234/2010** il Ministero della Sanità ha messo a disposizione delle ASL un budget di 1.500.000 euro.

In questo contesto la ASL RMG sta conducendo un lavoro di analisi rivolto ad individuare le necessità dei vari reparti presenti nei nosocomi di appartenenza, per poter quantificare il volume e la dimensione del budget necessario all'ammodernamento dei loro macchinari. Particolare attenzione è rivolta al reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Tivoli noto per la notevole affluenza di pazienti.


## OBIETTIVI

Lo scopo del progetto è quello di ammodernare il reparto rendendolo tecnologicamente avanzato, in grado di ospitare un numero maggiore di pazienti e poter competere con le migliori strutture presenti sul territorio.



## DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha come prima fase di realizzazione la definizione delle attività (WBS).

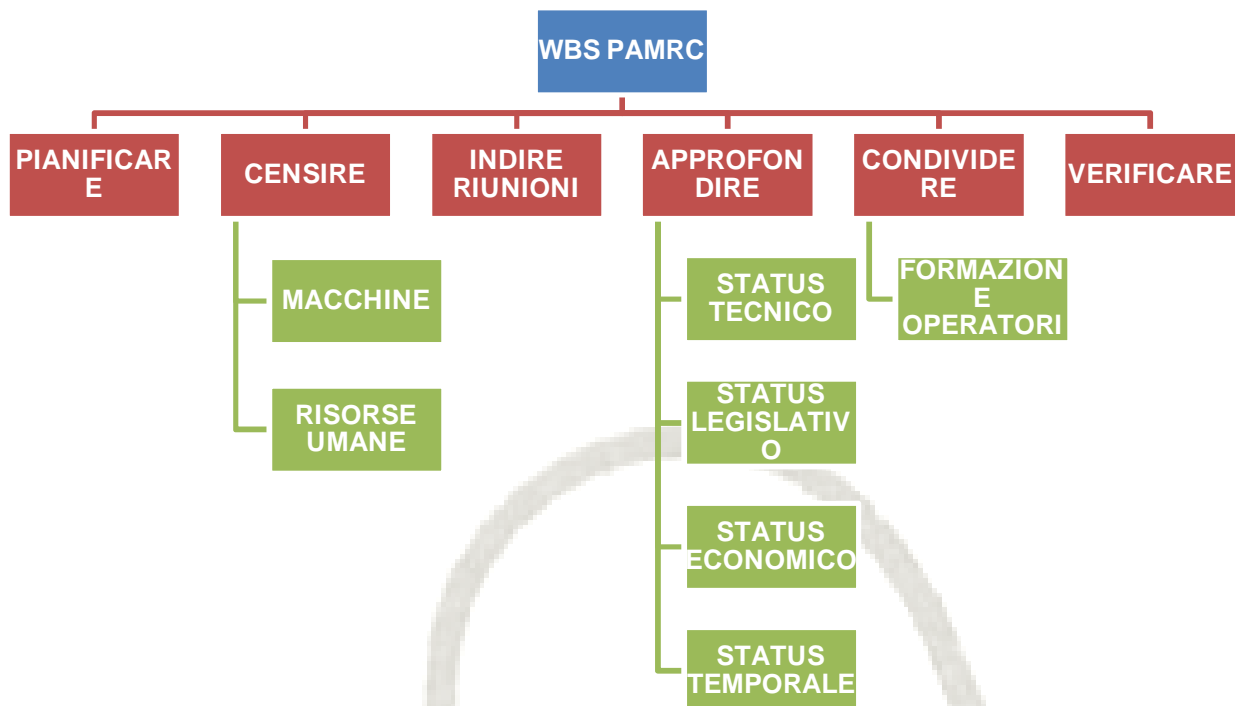


La seconda fase del progetto prevede l'assegnazione dei compiti e quindi la distribuzione delle responsabilità in base alle competenze(OBS).



La terza fase corrisponde all'ufficializzazione delle fasi del progetto e degli obiettivi, chiarendo quindi, i vari livelli di responsabilità per ciascuno degli elementi di lavoro individuati (RAM).

## PM COORDINATORE INFERMIERISTICO


PIANIFICARE	CENSIRE		INDIRE RIUNIONI	APPROFONDIRE				CONDIVIDERE	VERIFICARE
	MACCHINE	RISORSE UMANE		STATUS TECNICO	STATUS LEGISLATIVO	STATUS ECONOMICO	STATUS TEMPORALE		FORMAZIONE OPERATORI
DIR CARDIOLOGIA	✓			✓					✓
CFG CARDIOLOGIA		✓	✓	✓				✓	
UFF. GARE				✓	✓	✓		✓	
UFF. ACQUISTI							✓		
FORNITURA		✓							
UFF. TECNICO									✓

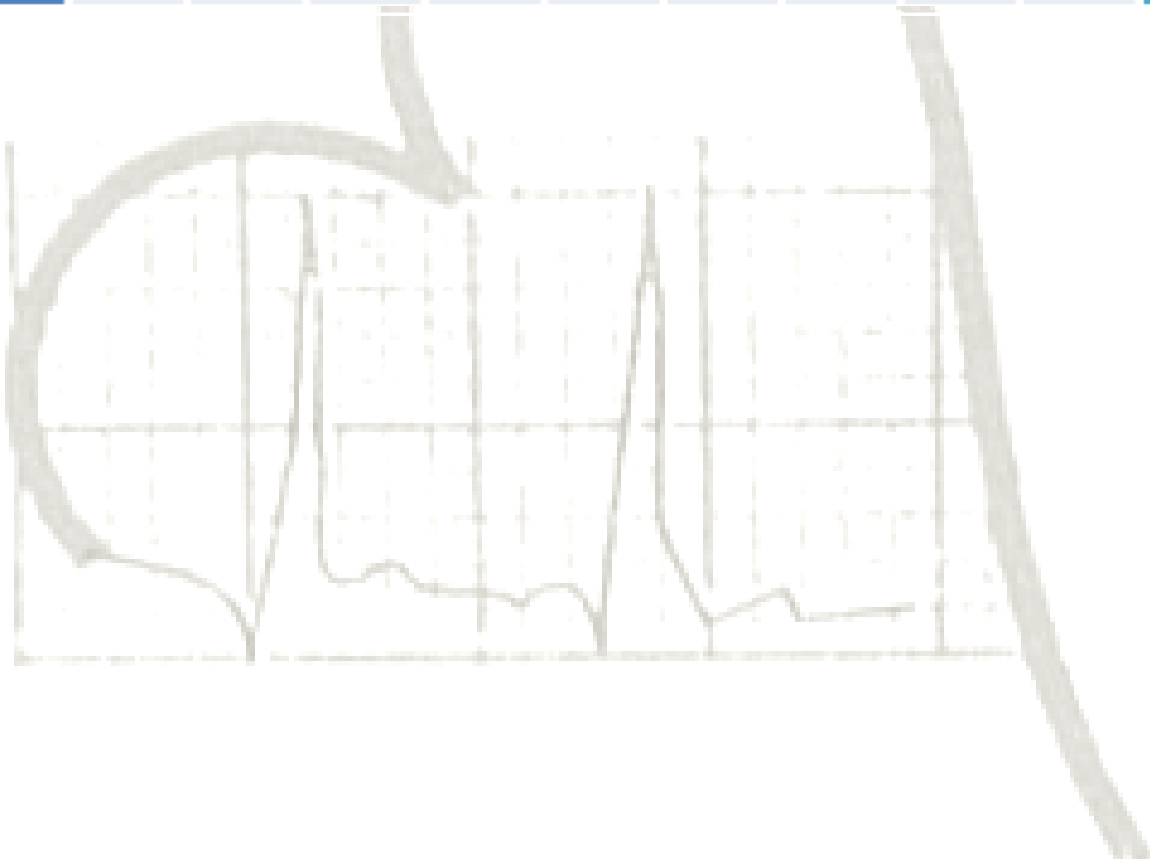

**Quarta fase del progetto è il GANTT, ovvero, la tempistica prevista per lo sviluppo e la realizzazione del progetto, che necessita di un periodo di un anno.  
 Data prevista di inizio lavori 01/01/2010.**

**Per tutti i dettagli si rimanda al GANTT di progetto.**

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	Ottobre	N	D
<b>Pianificare</b>												
<b>Censire</b>												
<b>Indire Riunioni</b>												
<b>Approfondire</b>												
<b>Condividere</b>												
<b>Verificare</b>												

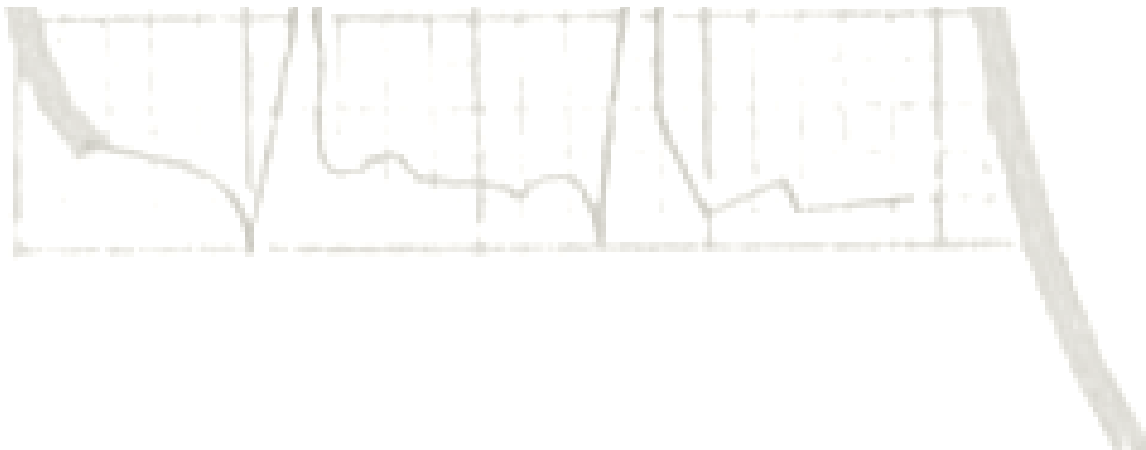

## IDENTIFICAZIONE DEI COSTI DEI MATERIALI E DELLE RISORSE UMANE

Tipo di Macchinario	Quantità	Costo Unitario	Totale
Elettrocardiografo	2	€500,00	€1.000,00
Ecocardiografo	1	€1.000,00	€1.000,00
Holter	2	€400,00	€800,00
Monitor	6	€500,00	€3.000,00
Defibrillatore	2	€1.000,00	€2.000,00
			€ 7.800,00

Risorse Umane	Costo Giornaliero	Mesi	Giorni Totali	Totale
Dirigente Cardiologia	€150,00	7	189	€28.350,00
Caposala Cardiologia	€90,00	6	162	€14.580,00
Ufficio Gare	€80,00	6	162	€12.960,00
Ufficio Acquisti	€70,00	4	108	€7.560,00
Fornitura	€50,00	3	81	€4.050,00
Ufficio Tecnico	€80,00	3	81	€6.480,00
				€ 73.980,00

O

## IDENTIFICAZIONE DEI COSTI NEL TEMPO

R

